

福留・関西新洋米村JV 県道高知本山線工事だより(9月号)



正連寺地区航空写真



日頃より工事にご協力頂き、まことにありがとうございます。9月に入って気温の方は、朝夕は少し涼しくなって来た様な感じがして来ましたね。食卓にはサンマやら秋めいた食べ物も出たと、そろそろ食欲の秋到来と言った所でしょうか？

近頃、北海道の地震や関西では大型台風の直撃など自然災害に被災された地域があり、高知でも台風の進路がたまたまそれて被害が少なかっただけで、南海トラフ大地震もいつ発生しても、おかしくない状況であるので、他人事とは思わず日頃からの職場・家庭での備えが大事だと考えております。

工事の方は、引き続きマシンガイダンスを搭載したバックホウにより切土掘削を行い、土質確認後、法枠での法面保護を行っています。作業には尾木建設さんとサクセス工業さんがあっており、台風接近等による雨に悩まされながらの工程となっておりますが、作業中の安全面に十分配慮し、早期に工事が完成出来るよう、慎重に作業を進めてまいります。

工事の進捗状況

5月度(施工前)

6月度(7段目掘削)

7月度(6段目掘削・7段目法枠工)

8月度(5段目掘削・6段目法枠工)


ICT技術を活用し、道路をなおしています

この道路工事は (アイ・コンストラクション)

i-Construction の活用現場です

ICTって? → 情報通信技術の導入で省力化を図る試みです

計画平面図

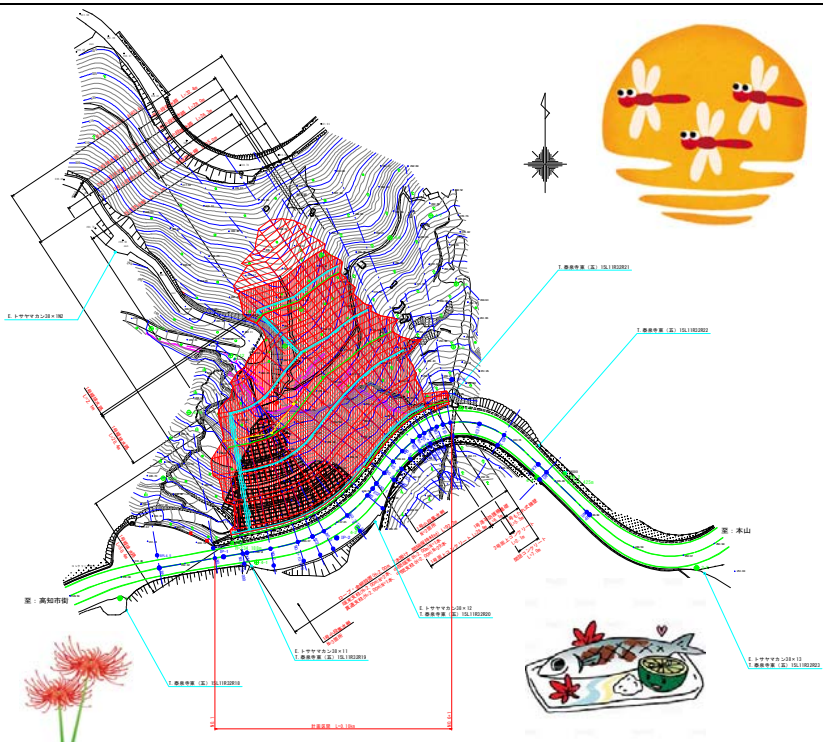

掘削・法面整形完了イメージ



施工状況(掘削・法面整形)

<p>① バックホウ(マシンガイダンス)による掘削・法面整形状況</p> <p>バックホウ(MG)にてモニター画面の計画に従い慎重に掘削・法面整形を行います。</p>	<p>② 不整地運搬車による仮設道路小運搬状況</p> <p>バックホウにて残土を不整地運搬車に積み込み仮設道路を使用して小運搬を行います。</p>	<p>③ バックホウによる残土積込状況</p> <p>再度、残土をバックホウにてダンプトラックに過積載にならないよう注意し積込みを行います。</p>	<p>④ ダンプトラックによる残土搬出状況</p> <p>ダンプトラックにて残土場に搬出を行いバックホウにて敷均しを行います。</p>
---	--	--	---

施工状況(法枠工)

<p>① 法枠組立状況</p> <p>法枠位置のスミ出しを行い鉄筋及びフレームを丁寧に組立ます。</p>	<p>② 法枠組立完了</p> <p>所定の幅・延長が確保されているか確認を行い法枠の組立完了です。</p>	<p>③ モルタル吹付状況</p> <p>リバウンドにより巣が出来ないように注意しながらモルタルを吹付ます。</p>	<p>④ モルタル吹付完了</p> <p>吹付面をコテで均しモルタル吹付の完了です。</p>
--	--	--	--



ご迷惑をおかけしますが引続き、ご協力をお願い致します。通行の際はお気をつけてお通り下さい。



発注者 : 高知県高知土木事務所
 施工業者 : 福留・関西新洋米村JV
 現場代理人 : 佐竹 寿雄
 監理技術者 : 北村 博孝
 主任技術者 : 竹崎 雅人
